

DODATOK č. 4 K ZMLUVE O DIELO č. 275/2021

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“) medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	MBB a. s.
Obchodné meno:	ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Sídlo:	Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva
V zastúpení:	JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať: vo veciach technických:	Ing. Matúš Hambálek, technik@mbb.sk , 0911 565 692 Ing. Ján Kulháný, jan.kulhany@mbb.sk , 0903 565 692
IČO:	36 039 225
DIČ:	2020093504
IČ DPH:	SK20200093504
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC:	GIBASKBX
Č. účtu v tvare IBAN:	SK90 0900 0000 0050 7523 9270
Registrácia:	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S
Zhotoviteľ:	ViaStav BB s.r.o.
Obchodné meno:	Zvolenská cesta 39, 974 05 Banská Bystrica
Sídlo:	Ing. Ľuboš Lieskovský
Štatutárny zástupca:	
Osoby oprávnené rokovať: vo veciach zmluvných:	Ing. Ľuboš Lieskovský
vo veciach technických:	Ing. Ľuboš Lieskovský
Bankové spojenie:	FIO Banka a.s.
IČO:	47 575 077
DIČ:	2024008800
IČO DPH:	SK2024008800
Telefón:	0905 136 242
Fax:	-----
E – mail:	viastav@viastav.sk
Registrácia:	Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 26235/S

Čl. 1

Preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 08.06.2021 Zmluvu o dielo č. 275/2021 podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“) predmetom ktorej je zhotovenie diela – stavby Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky zhotoviteľom pre objednávateľa (ďalej len „Dielo“).
- 1.2 Počas realizácie diela zhotoviteľom boli zistené navyše práce, ktoré neboli zahrnuté v pôvodnom rozpočte a ich nutnosť vykonania vyplynula až v priebehu vykonávania prác pri realizácii predmetu diela.

- 1.3 Tieto neočakávané navyše práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvnými stranami známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie týchto prác je potrebné pre dokončenie diela.

Čl. 2 Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah stavebných prác potrebných na zhotovenie diela uvedený v čl. 3 zmluvy o dielo a v prílohe č. 1 zmluvy o dielo sa rozširuje o nevyhnutné práce, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku a zároveň sa zmenovými listami poníža cena diela. Príloha č. 1 s uvedením súpisu prác navyše NP 7 a zmenových listov ZL4 - ZL 7 je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli na cene navyše prác vo výške podľa priloženého súpisu prác. Cena prác je **-349,21 EUR bez DPH** (slovom tristoštyridsaťdeväť eur a dvadsaťjedna centov). Celková cena diela uvedená v čl. 5, bod 5.2 zmluvy o dielo sa tak po pripočítaní ceny navyše prác podľa tohto dodatku mení na **382 181,32 EUR bez DPH** (slovom: tristoosemdesiatdvatisícosemdesiatjedna eur a tridsaťdva centov).
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že čl. 4, bod 4.1 zmluvy o dielo sa mení nasledovne:
- 4.1 Lehota realizácie diela:
Lehota začatia: **deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**
Lehota ukončenia: **230 dní**

Čl. 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých tri (3) vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 3.4 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinným sa stáva nasledujúci deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.

10. DEC. 2021
V Banskej Bystrici, dňa

Objednávatel':
MBB a.s.

.....
Ing. Dušan Argatás
predseda predstavenstva

.....
JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

10. DEC. 2021
V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:
ViaStav BB s.r.o.

.....
Ing. Ľuboš Lieskovský
konateľ

CSA 26
974 01
IČO: 36033333
reg. OS BB odd: 5a, v.č. 60/15

ZMENOVÝ LIST/ CONSTRUCTION CHANGE ORDER REQUEST FORM

Číslo/No: ZL 04 / 2021

Názov stavby:	Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky
Objekt/ Súbor/názov ZL	SO 01 Spevnené plochy
Objednávateľ:	MBB, a.s. , ČSA 36, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ:	ViaStav BB s.r.o. Zvolenská cesta 39, 974 05 Banská Bystrica
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: Skladba vozovky: SMA 11 O 5cm postrek 1,0 kg/m ² AC 16 L 6cm postrek 0,5kg/m ² AC 22 P 9cm postrek 0,5 kg/m ² CBGM C 8/10 15cm ŠD 0/63 20cm	
Návrh nového riešenia: Skladba vozovky: SMA 11 O 5cm postrek 0,5 kg/m ² AC 22 P 9cm postrek 0,5 kg/m ² CBGM C 8/10 20cm ŠD 0/63 20cm	
Dôvod zmeny: Z dôvodu časového urýchlenia prác na realizácii asfaltových vrstiev, vyťaženosti asfaltérskych čát a sťaženému prístupu nákladných áut na miesto realizácie bolo navrhnuté vypustiť zo skladby vrstvu AC 16 L hr. 6cm a nahradiť ju 5cm CBGM 8/10 navyše. Nová skladba vozovky spĺňa rovnaké parametre ako pôvodne navrhnutá.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu :	

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	Nie
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	-
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-

Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	Áno / Yes
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH:	38 176,35 €
Nová cena bez DPH:	31 189,10 €
Rozdiel +/-	- 6 987,25 €

Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	Nie
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD:	-
Nový termín dokončenia:	-

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko): Ing. Ľuboš Lieskovský

Dátum: 10. DEC. 2021

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude dotknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko): Ing. arch. V. Hladký

Dátum: 10. DEC. 2021

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko): Ing. Matúš Hambálek

Dátum: 10. DEC. 2021

Podpis:

Dodávateľ (meno, priezvisko): Ing. Ľuboš Lieskovský

Dátum: 10. DEC. 2021

Podpis:

Prílohy:

rozpočet

ZMENOVÝ LIST/ CONSTRUCTION CHANGE ORDER REQUEST FORM

Číslo/No: ZL 05 / 2021

Názov stavby:	Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky
Objekt/ Súbor/názov ZL	SO 04 Drobná architektúra a sadové úpravy
Objednávateľ:	MBB, a.s. , ČSA 36, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ:	ViaStav BB s.r.o. Zvolenská cesta 39, 974 05 Banská Bystrica
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: Projektová dokumentácia riešila výplň brán a bráničiek z ťahokovu.	
Návrh nového riešenia: Výplň z ťahokovu sa zamenila za poplastované pletivo zelenej farby. Zároveň sa nerealizovala na pokyn investora bránička 1000x1600mm v jestvujúcom oplotení zo strany kúpaliska.	
Dôvod zmeny: Dôvodom zámeny výplne bolo zjednotenie brán s naväzujúcim pletivom.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu :	

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	Nie
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	-
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-

Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	Áno / Yes
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH:	10 307,00 €
Nová cena bez DPH:	9 000,00 €
Rozdiel +/-	- 1 307,00 €

Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	Nie
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD:	-
Nový termín dokončenia:	-

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko): Ing. Ľuboš Lieskovský

Dátum:

Podpis:

10. DEC. 2021

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude dotknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko): Ing. arch. V. Hladký

Dátum

10. DEC. 2021

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko): Ing. Matúš Hambálek

Dátum

10. DEC. 2021

Podpis:

Dodávateľ (meno, priezvisko): Ing. Ľuboš Lieskovský

Dátum:

10. DEC. 2021

Podpis:

Prílohy:

rozpočet

ZMENOVÝ LIST/ CONSTRUCTION CHANGE ORDER REQUEST FORM

Číslo/No: ZL 06 / 2021

Názov stavby:	Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky
Objekt/ Súbor/názov ZL	SO 03 Verejné osvetlenie
Objednávateľ:	MBB, a.s. , ČSA 36, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ:	ViaStav BB s.r.o. Zvolenská cesta 39, 974 05 Banská Bystrica
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: Vo výkaz výmer bola položka č. 13 Rozvádzač RVO1 komplet, atest, doprava na stavbu.	
Návrh nového riešenia: Rozvádzač RVO1 pilierový, prepäťová ochrana, príprava pre switch + napájanie, komplet s dopravou na miesto, atest	
Dôvod zmeny: Na projektovanom mieste nebolo možné osadiť stenový rozvádzač RVO1 a preto sa musel použiť pilierový rozvádzač.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu :	

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	Nie
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	-
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-

Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	Áno / Yes
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH:	1 674,75 €
Nová cena bez DPH:	2 538,75 €
Rozdiel +/-	864,00 €

Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	Nie
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD:	-
Nový termín dokončenia:	-

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko): Ing. Ľuboš Lieskovský

Dátum:

10. DEC. 2021

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude dotknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko): Ing. arch. V. Hladký

Dátum

10. DEC. 2021

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko): Ing. Matúš Hambálek

Dátum

10. DEC. 2021

Podpis:

Dodávateľ (meno, priezvisko): Ing. Ľuboš Lieskovský

Dátum:

10. DEC. 2021

Podpis:

Prílohy:

rozpočet

ZMENOVÝ LIST/ CONSTRUCTION CHANGE ORDER REQUEST FORM

Číslo/No: ZL 07 / 2021

Názov stavby:	Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky
Objekt/ Súbor/názov ZL	SO 01 Spevnené plochy
Objednávateľ:	MBB, a.s. , ČSA 36, 974 01 Banská Bystrica
Dodávateľ:	ViaStav BB s.r.o. Zvolenská cesta 39, 974 05 Banská Bystrica
Pôvodné riešenie v zmysle ZoD: Vodorovné dopravné značenie zo striekaného plastu.	
Návrh nového riešenia: Vodorovné dopravné značenie striekané farbou.	
Dôvod zmeny: Poveternostné podmienky neumožnili dodržať technologický postup realizácie vodorovného značenia striekaným plastom.	
Požadovaný termín vyjadrenia k zmenovému listu :	

Vplyv zmeny na projektovú dokumentáciu:	Nie
Výkresovú dokumentáciu ku zmene spracuje:	-
Termín vyhotovenia dokumentácie:	-

Vplyv zmeny na zmluvnú cenu:	Áno / Yes
Pôvodná cena v zmysle ZoD bez DPH:	2 886,87 €
Nová cena bez DPH:	421,46 €
Rozdiel +/-	- 2 465,31 €

Vplyv zmeny na termín dokončenia diela:	Nie
Pôvodný termín dokončenia v zmysle ZoD:	-
Nový termín dokončenia:	-

Zmenu navrhuje (meno, priezvisko): Ing. Ľuboš Lieskovský

Dátum: 10. DEC. 2021

Podpis:

Súhlas s realizáciou zmeny a prehlásenie, že predmetnou zmenou nebude dotknutá kvalita diela ani ostatné zmluvné podmienky a zostane zachovaný charakter a účel diela definovaný v Zmluve o dielo.

Projektant (meno, priezvisko): Ing. arch. V. Hladký

Dátum 10. DEC. 2021

Podpis:

Objednávateľ (meno, priezvisko): Ing. Matúš Hambálek

Dátum 10. DEC. 2021

Podpis:

Dodávateľ (meno, priezvisko): Ing. Ľuboš Lieskovský

Dátum: 10. DEC. 2021

Podpis:

Prílohy:


rozpočet

Dôvodová správa k dodatku č. 4

1. Identifikácia prijímateľa a Zmluvy		
Názov prijímateľa	IČO	DIČ
MBB a.s.	36039225	SK20200093504
Sídlo prijímateľa		
ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica		
Názov projektu		
Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky		

1. Popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny (vrátane projektovej dokumentácie):

- Bolo nutné čerpať odpadové vody z existujúcej kanalizačnej šachty do doby zrealizovania novej šachty a prepadu do potoka. Počas realizácie diela bolo na skládku vyvezených viac ton zeminy ako predpokladal zmluvný rozpočet. V chodníku sa osadil nový kompozitný poklop na existujúcej vodomernej šachte. Vo výkaze výmer bol uvedený chybný počet parkovacích dorazov a bolo nutné použiť 47 ks navyš. Projektová dokumentácia neriešila vstupné dvierka v ľahokove pod terasou a bolo ich potrebné dodatočne vyrobiť. Realizácia oporného múru si vyžiadala montáž nerezového zábradlia. Projekt dvojkrídlovej brány na vstupe bol chybný, nakoľko by sa pri navrhutej šírke zúžila prístupová cesta. Bolo nutné bránu rozšíriť. Z konštrukčného a nosného hľadiska bolo nutné osadiť na betónový základ pre posuvnú teleskopickú bránu oceľový U profil š. 180mm, na ktorý sa nainštalovali vodiace koľajnice.

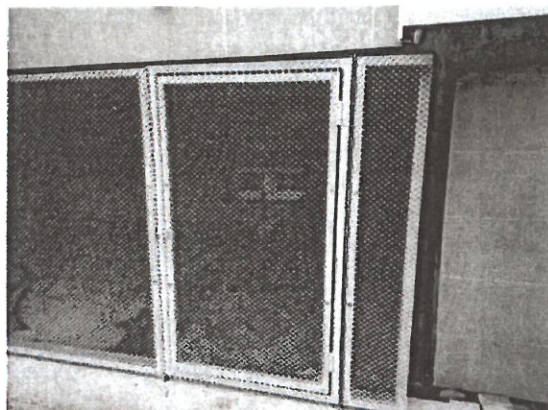

2. Vplyv na harmonogram prác a lehotu výstavby

Doba výstavby sa predĺži o 40 dní. Posun lehoty je spôsobený naviac prácami NP7 a tiež situáciou spôsobenou pandémiou COVID 19. 50 % pracovníkov našej firmy je na pandemickej PN z dôvodu pozitívneho testu alebo karatény. Rovnáká je situácia aj u niektorých našich subdodávateľov, ktorý nemôžu vykonávať práce. Problémom sú tiež oneskorené dodávky nedostupných materiálov. Momentálne práce ovplyvňuje aj počasie - celodenné mrazy a sneh.

3. Vplyv na cenu v časti Diela:

Konečný cenový dopad vyplývajúci zo zmeny je vyčíslený v prílohe

4. Vplyv na majetko-právne pomery:

Navrhovaná zmena si nevyžiada zmenu majetkovo-právnych pomerov

5. Vplyv na ostatné časti Diela alebo podmienky Zmluvy o dielo:

Navrhovaná zmena okrem vyššie uvedeného nemá vplyv na ostatné časti Diela a podmienky Zmluvy o dielo.

Podpis

Prijímateľ
MBB a.s.

Zhotoviteľ
ViaStav BB s.r.o.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

ViaStav BB s.r.o.

9. bystrica

MBB a.s.

-5-

ČSA 26

974 01

NO: 36 C
reg. ... odd.: Sa, vl.č. 601/S

.....
Ing. Juraj Džmura
konateľ spoločnosti

.....
Ing. Ľuboš Lieskovský
konateľ spoločnosti a
hlavný stavbyvedúci

.....
Ing. Matúš Hambálek
stavebný dozor

.....
Ing. Tomáš Dančo
stavbyvedúci

Miesto podpisu:

Dátum podpisu:

Zoznam príloh k žiadosti o zmenu zmluvy ¹	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

¹ Prijímateľ uvedie relevantné prílohy, ktoré prikladá k žiadosti.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: BB
Stavba: Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

JKSO:
Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:
MBB a.s.

Zhotoviteľ:
ViaStav BB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 10.12.2021

IČO: 36039225
IČ DPH: SK20200093504

IČO: 47575077
IČ DPH: SK2024008800

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	-349,21
--------------	---------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	-349,21	-69,84

Cena s DPH	v	EUR	-419,05
------------	---	-----	---------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BB

Stavba: Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 10.12.2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: ViaStav BB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		-349,21	-419,05
NP7	Ostatné	9 546,35	11 455,62
ZL4	Zmena skladby vozovky	-6 987,25	-8 384,70
ZL5	Zámena ťahokovu za pletivo na bránach	-1 307,00	-1 568,40
ZL6	Zámena RVO	864,00	1 036,80
ZL7	Zámena materiálu VDZ	-2 465,31	-2 958,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

NP7 - Ostatné

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

MBB a.s.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.12.2021

IČO:

36039225

IČ DPH:

SK20200093504

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			9 546,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 546,35	20,00%	1 909,27
Cena s DPH	v EUR		11 455,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

NP7 - Ostatné

Miesto:

Banská Bystrica

Objednávateľ:

MBB a.s.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Dátum:

10.12.2021

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 546,35

HSV - Práce a dodávky HSV

3 957,02

1 - Zemné práce

3 644,68

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

128,95

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

8 - Rúrové vedenie

104,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

79,39

PSV - Práce a dodávky PSV

5 589,33

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 589,33

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt: NP7 - Ostatné

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 10.12.2021

Objednávateľ: MBB a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ: ViaStav BB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 546,35

D HSV Práce a dodávky HSV

3 957,02

D 1 Zemné práce

3 644,68

13	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	328,000	1,50	492,00
----	---	-------------	---	-----	---------	------	--------

W od 1.10. do 10.11.

W 41*8 328,000

14	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	41,000	1,61	66,01
----	---	-------------	--	-----	--------	------	-------

1	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	266,750	3,58	954,97
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

2	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	266,750	0,52	138,71
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

3	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	266,750	0,65	173,39
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	493,480	5,00	2 467,40
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

W Skutočnosť mínus Rozpočet

W 1748,72-1255,24 493,480

26	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	-790,000	0,57	-450,30
----	---	-----------	--	----	----------	------	---------

27	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	-39,500	5,00	-197,50
----	---	------------	-------------------------------	----	---------	------	---------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

128,95

21	K	311321311.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20	m3	0,500	76,43	38,22
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

W vyspravenie oporného múru

W 0,25 0,250

W obetónovanie elektromerovej skrine

W 0,25 0,250

W Súčet 0,500

22	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,025	2 028,00	50,70
----	---	-------------	--	---	-------	----------	-------

19	K	341351103.S	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	2,500	11,73	29,33
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

20	K	341351104.S	Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	2,500	4,28	10,70
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

D 4 Vodorovné konštrukcie

0,00

D 8 Rúrové vedenie

104,00

15	K	899101111.S	Osadenie poklopu D600 vodoromnej šachty vrátane úpravy otvoru	ks	1,000	50,00	50,00
----	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

16	M	592240008100.S	Poklop kompozitný D600, tr. zaťaženia A15	ks	1,000	54,00	54,00
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

79,39

7	K	915940011	Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty	ks	47,000	5,25	246,75
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

W skutočnosť - rozpočet

W 106-59 47,000

8	M	404490004400	Parkovacia dorazová lišta, rozmer 900x152x102 mm	ks	47,000	1,50	70,50
---	---	--------------	--	----	--------	------	-------

23	K	917862111	Osadenie chodníka obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	-23,000	10,00	-230,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

W odpočet oporný múr

W -23 -23,000

24	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	-23,000	3,82	-87,86
----	---	--------------	---	----	---------	------	--------

18	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,000	80,00	80,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		schody				
	VV		1		1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 589,33
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				5 589,33
9	K	767137512	Úprava dielu + dvierka v ťahokove pod terasou	ks	1,000	735,50	735,50
5	K	767163105	Montáž zábradlia nerezové na oporný múr	m	6,000	20,00	120,00
28	M	553520001100.S	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1100 mm	m	6,000	260,00	1 560,00
29	M	311990004000.S	Nerezové kotvenie do betónového oporného múru + chemické kotvy	ks	5,000	169,60	848,00
25	K	767916560.S	D+M stĺpika ocelového plotového d60 výšky 5m vrátane zemných prác	ks	2,000	275,00	550,00
12	K	767920240-1	Rozšírenie dvojkrídlovej brány a bráničky poz.p02	ks	1,000	930,00	930,00
	VV		" poz.p02 " 1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
10	K	767995159.S	Montáž nosných a pomocných konštrukcií z ocel. profilov hmotnosti nad 10 kg/m	m	16,500	8,97	148,01
11	M	134840000800.S	Týč oceľová prierezu U 180 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,370	1 886,00	697,82
	VV		0,363*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		0,370		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

ZL4 - Zmena skladby vozovky

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

MBB a.s.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.12.2021

IČO:

36039225

IČ DPH:

SK20200093504

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			-6 987,25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	-6 987,25	20,00%	-1 397,45
Cena s DPH			-8 384,70
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

ZL4 - Zmena skladby vozovky

Miesto:

Banská Bystrica

Objednávateľ:

MBB a.s.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Dátum:

10.12.2021

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-6 987,25

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 987,25

5 - Komunikácie

-6 987,25

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

ZL4 - Zmena skladby vozovky

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

10.12.2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-6 987,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

-6 987,25

D 5

Komunikácie

-6 987,25

1	K	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	-775,500	7,50	-5 816,25
4	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	775,500	10,09	7 824,80
5	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	-775,500	0,80	-620,40
3	K	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	-775,500	10,80	-8 375,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

ZL5 - Záměna ťahokovu za pletivo na bránach

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

MBB a.s.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.12.2021

IČO:

36039225

IČ DPH:

SK20200093504

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-1 307,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	-1 307,00	20,00%	-261,40

Cena s DPH

v EUR

-1 568,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

ZL5 - Záměna ťahokovu za pletivo na bránach

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

10.12.2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-1 307,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 307,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

-1 307,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

ZL5 - Záměna ťahokovu za pletivo na bránach

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

10.12.2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 307,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-1 307,00

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

-1 307,00

12	K	767920210	Montáž vrat a vratok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivu do 2 m2	ks	-1,000	175,00	-175,00
5	M	55358500-PC01	Bránička jednokrídlová 1000x1600 mm, rám Jakl, výplň pletivo, vrátane stĺpikov - poz.p03	ks	-1,000	391,00	-391,00
7	M	55358500-PC05	Bránička jednokrídlová 1000x1600 mm, rám Jakl, výplň ťahokov, vrátane stĺpikov - poz.p02	ks	-1,000	391,00	-391,00
13	M	55358500-PC05-1	Bránička jednokrídlová 1000x1600 mm, rám Jakl, výplň pletivo, vrátane stĺpikov - poz.p02	ks	1,000	350,00	350,00
9	M	55358500-PC02	Brána dvojkrídlová 4400x1600 mm, rám Jakl, výplň ťahokov, vrátane stĺpikov, zámku a FAB alebo ekvivalent vložky - poz.p02	ks	-1,000	1 530,00	-1 530,00
11	M	55358500-PC02-1	Brána dvojkrídlová 4400x1600 mm, rám Jakl, výplň pletivo, vrátane stĺpikov, zámku a FAB alebo ekvivalent vložky - poz.p02	ks	1,000	1 330,00	1 330,00
2	M	55358500-PC06	Brána dvojkrídlová teleskopická 10700x1900 mm, rám Jakl, výplň ťahokov, vrátane stĺpikov, pojazďového profilu, elektromotora s príslušenstvom, diaľkové ovládanie otváranie - poz.p07	ks	-1,000	7 820,00	-7 820,00
10	M	55358500-PC06-1	Brána dvojkrídlová teleskopická 10700x1900 mm, rám Jakl, výplň pletivo, vrátane stĺpikov, pojazďového profilu, elektromotora s príslušenstvom, diaľkové ovládanie otváranie - poz.p07	ks	1,000	7 320,00	7 320,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

ZL6 - Záměna RVO

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

MBB a.s.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.12.2021

IČO:

36039225

IČ DPH:

SK20200093504

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

864,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	864,00	20,00%	172,80

Cena s DPH

v EUR

1 036,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

ZL6 - Záměna RVO

Miesto:

Banská Bystrica

Objednávateľ:

MBB a.s.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Dátum:

10.12.2021

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

864,00

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

864,00

M21 - 155 Elektromontáže

864,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

ZL6 - Záměna RVO

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

10.12.2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

864,00

D D1 PRÁCE A DODÁVKY M

864,00

D M21 155 Elektromontáže

864,00

1	M	0191RVO1	Rozvádzač RVO1 komplet, atest, doprava na stavbu		-1,000	1 674,75	-1 674,75
2	M	0191RVO1-2	Rozvádzač RVO1 pilierový, prepáťová ochrana, príprava pre switch + napájanie, komplet s dopravou na miesto, atest		1,000	2 538,75	2 538,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

ZL7 - Záměna materiálu VDZ

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

MBB a.s.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 10.12.2021

IČO:

36039225

IČ DPH:

SK20200093504

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

-2 465,31

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
-2 465,31

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
-493,06

Cena s DPH

v EUR

-2 958,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

ZL7 - Záměna materiálu VDZ

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

10.12.2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

-2 465,31

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 465,31

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-2 465,31

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

ZL7 - Záměna materiálu VDZ

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

10.12.2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

Projektant:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 465,31

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 465,31

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-2 465,31

7	K	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	401,000	0,42	168,42
6	K	915711221.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá základná	m	52,000	0,45	23,40
8	K	915711311.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	105,500	0,33	34,82
9	K	915711511.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná	m	18,000	0,38	6,84
1	K	915711621	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá základná	m	-52,000	4,41	-229,32
2	K	915712311	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	-401,000	3,57	-1 431,57
3	K	915712321	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	-105,500	3,57	-376,64
4	K	915712421	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná	m	-18,000	7,14	-128,52
10	K	915721211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	26,000	7,23	187,98
5	K	915721411	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	-26,000	27,72	-720,72
